



UniGames

Ομάδα 50

Διοργάνωση αθλητικού τουρνουά μεταξύ πανεπιστημίων

Συγγραφική Ομάδα:	Ομάδα 50
Υπεύθυνος:	Πολύζου Μαριάνθη
Έκδοση:	2η
Ημερομηνία:	13/01/2025
Τύπος παραδοτέου:	Baseline Report

Ομάδα Έργου

	Ρόλος	Όνομα
1.	Project Manager	ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
2.	Communication and Promotion Manager	ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3.	Logistics Manager	ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4.	Registrations Manager	ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΣΟΦΙΑ
5.	Referees and Regulations Manager	ΜΑΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ

Ιστορικό Αναθεώρησης

Έκδοση	Ημερομηνία	Υπεύθυνος	Περιγραφή
1η	02/12/2024	ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ	Interim Baseline Report
2η	13/01/2025	ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ	Baseline Report

Πίνακας Περιεχομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

- 2.1. ΔΟΜΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
- 2.2. ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- 2.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- 2.4. ΠΛΑΝΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

- 3.1. PROJECT SCOPE
- 3.2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΥ
- 3.3. PROJECT CHARTER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

- 4.1. ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (WBS)
- 4.2. GANTT DIAGRAM
- 4.3. MILESTONES/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ DEADLINES
- 4.4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ (RAM/RACI)
- 4.5. RESOURCE USAGE CHART

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

- 5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
- 5.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

- 6.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ
- 6.2 ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ
- 6.3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
- 6.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΡΩΝ

7. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

8. ΠΗΓΕΣ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Λίστα Εικόνων

Εικόνα 1: Zoom meeting

Εικόνα 2 :Πλάνο λήψης αποφάσεων

Εικόνα 3: Project charter

Εικόνα 4: WBS

Εικόνα 5: Διάγραμμα Gantt(1/6)

Εικόνα 6: Διάγραμμα Gantt(2/6)

Εικόνα 7: Διάγραμμα Gantt(3/6)

Εικόνα 8: Διάγραμμα Gantt(4/6)

Εικόνα 8: Διάγραμμα Gantt(5/6)

Εικόνα 9: Διάγραμμα Gantt(6/6)

Εικόνα 10: Πίνακας Κόστους

Εικόνα 11: Ανεπάρκεια πόρων(1/4)

Εικόνα 12: Ανεπάρκεια πόρων(2/4)

Εικόνα 13: Ανεπάρκεια πόρων(3/4)

Εικόνα 14: Ανεπάρκεια πόρων(4/4)

Εικόνα 15: Λύση του προβλήματος

Λίστα Πινάκων

Πίνακας 1: MILESTONES/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ DEADLINES

Πίνακας 2: Ορόσημα

Πίνακας 3:Ανάθεση ρόλων (RAM)

Πίνακας 4: Resource usage chart

Πίνακας 5: Διαχείριση Κινδύνων

1.Εισαγωγή

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το πανεπιστημιακό τουρνουά αθλητισμού έχει ως σκοπό να ενισχύσει το αίσθημα της κοινότητας και την ευγενή άμιλλα ανάμεσα στους φοιτητές των διαφόρων σχολών. Μέσα από τον αθλητισμό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να ψυχαγωγηθούν. Συγκεκριμένα, το τουρνουά θα περιλαμβάνει δημοφιλή αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, και τένις, με σκοπό να προωθήσει την συμμετοχή τόσο των ομάδων όσο και των μεμονωμένων αθλητών. Βασικοί στόχοι του έργου είναι τόσο η ενίσχυση της φοιτητικής κοινότητας και η παροχή δυνατότητας σε φοιτητές κοινωνικοποίηση, όσο η προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φιλανθρωπίας, καθώς όλα τα έσοδα από το τουρνουά θα διατεθούν για την ενίσχυση του συλλόγου «Αχτίδα» ο οποίος δραστηριοποιείται στην στήριξη οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός, ενισχύοντας την φοιτητική ζωή, και προωθώντας την ιδέα ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει εργαλείο για κοινωνική αλλαγή.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Υπολογισμός Εσόδων από Εισιτήρια και Συμμετοχές

Κόστος εισόδου : 3 € ανά άτομο

Κόστος συμμετοχής : 2 € ανά άτομο

Μέγιστος αριθμός ατόμων : 200 παίκτες και 500 θεατές

ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : $200 \times 2 + 500 \times 3 = 1900$ €

Υπολογισμός Εσόδων από Χορηγίες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ : 10

Μικρές επιχειρήσεις : 300 €

Μεγάλες επιχειρήσεις : 500 €

ΑΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : $6 \times 300 + 4 \times 500 = 3800$ €

Επομένως στόχος μας είναι η συγκέντρωση του χρηματικού ποσού των $3800 + 1900 = 5700$ € .

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ο σκοπός του εγγράφου είναι η λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση της στρατηγικής και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διοργάνωση ενός αθλητικού πανεπιστημιακού τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα συνδυάζει την ομαδικότητα, την ψυχαγωγία και την κοινωνική προσφορά. Το συγκεκριμένο έγγραφο λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή για την αποτελεσματική οργάνωση του τουρνουά, προσφέροντας πληροφορίες και οδηγίες που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία του. Αναλυτικότερα, μέσω του εγγράφου θα αναλυθούν διεξοδικά η οργάνωση και η δομική ανάλυση του έργου, ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός, η διαχείριση αλλαγών και κινδύνων, καθώς και ο έλεγχος της υλοποίησης και την ολοκλήρωση του έργου.

2.Κεφάλαιο 1

2.1. ΔΟΜΗ/ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

Μέσα από διαδικασίες εντός της ομάδας μας αποφασίστηκαν και δόθηκαν η εξής θέσης για το κάθε μέλος:

Project Manager: Πολύζου Μαριάνθη

Communication and Promotion Manager: Χατζηανδρέου Νικολέτα

Logistics Manager : Μπάρκα Παναγιώτα


Registrations Manager : Τουμπέλη Σοφία

Referees and Regulations Manager : Μαυριά Ελένη – Μαρία

Επιπλέον αποφασίστηκε πως για την διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων θα δημιουργούνται ομάδες οι οποίες θα είναι υπεύθυνες. Τέλος οι παραπάνω ρόλοι που ανατέθηκαν στα μέλη της ομάδας δεν περιορίζουν τους τομείς εργασίας των μελών.

2.2 .ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ομάδα του έργου καθόρισε δύο ημέρες της εβδομάδα (Κυριακή , Τρίτη) στις οποίες στην πρώτη γίνεται μία ανασκόπηση , από το κάθε μέλος ή υποομάδα, σχετικά με την πρόοδο της δραστηριότητας που έχει αναλάβει και έπειτα συζητούνται καίρια ζητήματα των οποίων η λύση αποφασίζεται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών. Κατά την δεύτερη συνάντηση αναθέτονται οι εργασίες της επομένης εβδομάδας και δημιουργούνται υποομάδες σε περιπτώσεις που απαιτείται παραπάνω από ένα άτομο. Πέραν τον δύο τακτικών συναντήσεων ο PM αλλά και το κάθε μέλος της ομάδας, ύστερα από συνεννόηση με τον PM μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτα συμβούλια για σημαντικά ζητήματα ή προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την πρόοδο του έργου.

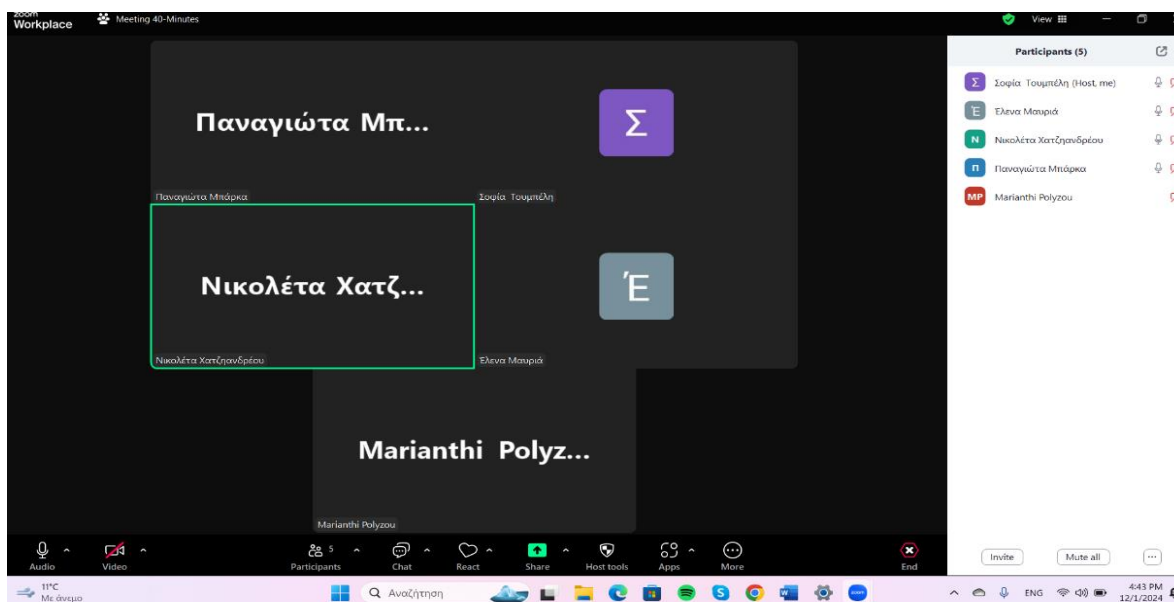

Εικόνα 1.

2.3.ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επικοινωνία : Λόγω του διαφορετικού ωραρίου του κάθε ατόμου οι συναντήσεις αρκετές φορές απαιτείται να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Για αυτό τον λόγο η ομάδα κάνει χρήση της εφαρμογής Zoom meetings , επιπλέον για τον προγραμματισμό των συναντήσεων μας , εξ αποστάσεως και δια ζώσης, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Google Calendar, ενώ για την ανταλλαγή περιεχομένου η πλατφόρμα Google drive.

Τεχνικά : Για την δημιουργία και απεικόνιση των ζητημάτων που απαιτούνται η ομάδα έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει το εξής εργαλεία:

- Microsoft Word
- Microsoft Power Point


Σημείωση : Η παραπάνω λίστα με τα τεχνολογικά λογισμικά που χρησιμοποιεί η ομάδα δεν είναι μόνιμη καθώς για κάθε νέα απαίτηση του εντολέα του έργου η ομάδα προσθέτει καινούργια εργαλεία για την καλύτερη υλοποίηση.

2.4.ΠΛΑΝΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της ομάδας του έργου ακολουθούν τα εξής βήματα:

1. Συζήτηση προβλήματος
2. Κατάθεση αναλυτικών λύσεων από τα μέλη της ομάδας
3. Εσωτερική ψηφοφορία
4. Σε περίπτωση πλειοψηφίας πραγματοποιείται η λύση με της περισσότερες ψήφους
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας τα μέλη καλούνται να εμπλουτίσουν με επιχειρήματα την άποψη τους

τους

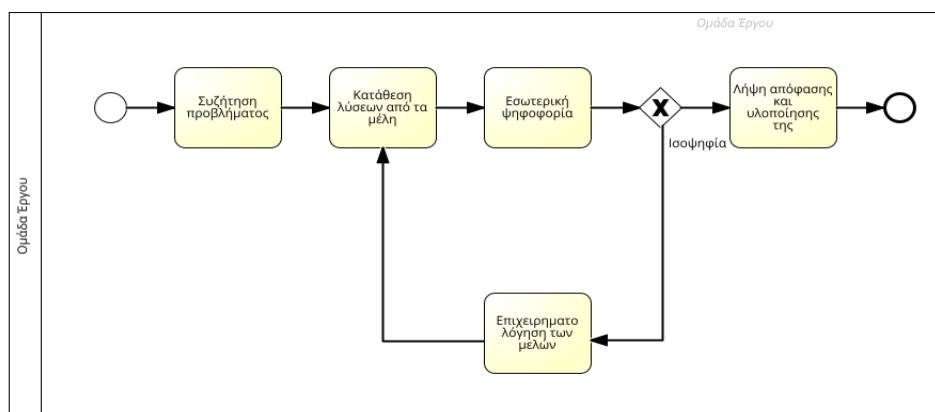

Εικόνα 2.

3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

3.1 PROJECT SCOPE

Στόχος της διοργάνωσης UniGame είναι η διεκπεραίωση ενός πανεπιστημιακού αθλητικού τουρνουά που αποβλέπει αφενός στην συλλογή ενός χρηματικού ποσού για την στήριξη του συλλόγου “ΑΧΤΙΔΑ” και αφετέρου στην προώθηση του αθλητικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Τα παραδοτέα του συγκεκριμένου project είναι οι αγώνες που θα διεξαχθούν (ποδοσφαίρου , στίβου , μπάσκετ , βόλεϊ, τένις), τα διαγωνιστικά έγγραφα, δηλαδή οι κανονισμοί για κάθε άθλημα καθώς και το πρόγραμμα αγώνων. Επιπλέον στα παραδοτέα αυτού του έργου ανήκουν και οι υποδομές στις οποίες περιλαμβάνονται οι κρατήσεις γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων όπως επίσης και η παροχή εξοπλισμού (μπάλες ,φανέλες κλπ.) .Τέλος, η ιατρική κάλυψη καθώς και η διοικητική ομάδα για την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων είναι κάποια ακόμα στοιχεία του παραδοτέου.

Η εξασφάλιση χορηγιών αποτελεί μια βασική απαίτηση για την κάλυψη των εξόδων του έργου και την οικονομική υποστήριξη του στόχου μας . Επιπλέον μια ακόμα απαίτηση που θεωρείται εξίσου σημαντική είναι η ομαλή συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και τα τμήματα φοιτητικής μέριμνας των πανεπιστημίων.

IN SCOPE

- Διοργάνωση πανεπιστημιακού αθλητικού τουρνουά.
- Συλλογή χρημάτων για τη στήριξη του συλλόγου “ΑΧΤΙΔΑ”.
- Προώθηση του αθλητικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων.
- Εξασφάλιση χορηγιών για κάλυψη εξόδων και οικονομική υποστήριξη του στόχου.
- Ιατρική κάλυψη για τους αγώνες.
- Κρατήσεις γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
- Παροχή εξοπλισμού (μπάλες, φανέλες, κ.λπ.).
- Συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και τμήματα φοιτητικής μέριμνας.
- Συγκρότηση διοικητικής ομάδας για τη διοργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή.
- Δημιουργία διαγωνιστικών εγγράφων
- Κανονισμοί για κάθε άθλημα.
- Πρόγραμμα αγώνων.

OUT OF SCOPE

- Δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων (μόνο κρατήσεις υφιστάμενων).
- Μακροχρόνια διαχείριση των συνεργασιών με φοιτητικούς συλλόγους.
- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή μαθήματα αθλητισμού.
- Μεταφορά εξοπλισμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων
- Μεταφορά αθλητών από και προς τους χώρους διεξαγωγής
- Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ενδεχόμενα προβλήματα με τους προμηθευτές

3.1.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΥ

Οι εμπλεκόμενοι αυτού του έργου αποτελούνται από:

- Τους κύριους διοργανωτές
- Τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης
- Τον αρμόδιο τομέα του Δήμου Θεσσαλονίκης για την παροχή των γηπέδων
- Τους εθελοντές φοιτητές που θα βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων
- Τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά
- Φοιτητές που θα παρακολουθήσουν δίνοντας ένα χρηματικό ποσό για την είσοδο τους
- Το ιατρικό προσωπικό
- Ο σύλλογος “ΑΧΤΙΔΑ”
- Το συνεργείο καθαρισμού/φωτογράφους/dj

3.1.2 PROJECT CHARTER

PROJECT CHARTER

1. General Project Information				
Project Name:		UniGames		
Impact of project:		Ενίσχυση Συλλόγου ατόμων με αυτισμό ΑΧΤΙΔΑ		
2. Project Team				
	Name	ROLE	Telephone	E-mail
Project Manager :	ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ	Project Manager	6985682658	lis24040@uom.edu.gr
Team Members:	ΜΠΑΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	Logistics Manager	6940763604	lis24099@uom.edu.gr
	ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ	Communication and Promotion Manager	6984170426	lis24029@uom.edu.gr
	ΜΑΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ	Referees and Regulations Manager	6988200239	lcs24016@uom.edu.gr
	ΤΟΥΜΠΕΛΗ ΣΟΦΙΑ	Registrations Manager	6986488294	lcs24012@uom.edu.gr
3. Stakeholders (e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project)				
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα : Φοιτητές όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μπορούν να λάβουν μέρος και να στηρίξουν την δράση μας !				
Άμεσα επηρεαζόμενοι είναι ο σύλλογος Αχτίδα που θα απολάβει χρηματική βοήθεια από τα έσοδα τουρνουά με σκοπό την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τους και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης				
4. Project Scope Statement				
Project Purpose / Business Justification Describe the business need this project addresses				
Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην διοργάνωση ενός πανεπιστημιακού αθλητικού τουρνουά που θα ενισχύσει το αίσθημα της κοινότητας και την ευγενή άμιλλα ανάμεσα στους φοιτητές των διαφόρων σχολών. Η προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φιλανθρωπίας αποτελεί τον κύριο στόχο μας καθώς όλα τα έσοδα από το τουρνουά θα διατεθούν για την ενίσχυση του συλλόγου "ΑΧΤΙΔΑ".				
Major Known Risks (including significant Assumptions) Identify obstacles that may cause the project to fail.				
Risk	Risk Rating (High, Med, Low)			
Μειωμένη Συμμετοχή Αθλητών	High			
Μειωμένη Συμμετοχή Εθελοντών	Med			
Αδυναμία Οργάνωσης Αποτελεσματικού Αγωνιστικού Προγράμματος	High			
5. Communication Strategy (specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc.				
Η επικοινωνία του PM με τους χορηγούς του project γίνεται μέσω επαγγελματικών συναντήσεων δια ζώσης (meetings), με την χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) για την άμεση αντιμετώπιση απρόοπτων μικρών προβλημάτων και την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας (zoom meetings) .				

Submitted by: [Name]

Page 1 of 2

For assistance in using this template, contact NYU's Office of Learning and Organizational Development at 212-998-1250.

Εικόνα 3.

4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

4.1. ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (WBS)




Εικόνα 4.

4.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANT


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Fixed Cost	4 Nov '24
1	start	0 days	Mon 4/11/24	Mon 4/11/24		0,00 €	0,00 €	S M T W T F S
2	Σχεδίαση έργου	18 days	Mon 4/11/24	Wed 27/11/24		0,00 €	0,00 €	
3	Συγγραφή ομάδας	5 days	Mon 4/11/24	Fri 8/11/24	1	0,00 €	0,00 €	
4	Ορισμός PM	2 days	Mon 11/11/24	Tue 12/11/24	3	0,00 €	0,00 €	
5	Kick-off συνάντηση	2 days	Wed 13/11/24	Thu 14/11/24	3,4	0,00 €	0,00 €	
6	Καθορισμός στόχων και απαιτήσεων	3 days	Fri 15/11/24	Tue 19/11/24	5	0,00 €	0,00 €	
7	Καθορισμός in score και out of score	3 days	Wed 20/11/24	Fri 22/11/24	6	0,00 €	0,00 €	
8	Καθορισμός προϋπολογισμού	2 days	Mon 25/11/24	Tue 26/11/24	7	0,00 €	0,00 €	
9	Εκτίμηση ρίσκων	1 day	Wed 27/11/24	Wed 27/11/24	8	0,00 €	0,00 €	
10	Άδειες	25 days	Thu 28/11/24	Wed 1/12/24	2	110,00 €	0,00 €	
11	Επικοινωνία με πρύτανη	2 days	Thu 28/11/24	Fri 29/11/24	9	0,00 €	0,00 €	
12	Επικοινωνία με δήμο	5 days	Mon 2/12/24	Fri 6/12/24	11	100,00 €	0,00 €	
13	Επικοινωνία με ίδρυμα	7 days	Mon 9/12/24	Tue 17/12/24	12	0,00 €	0,00 €	
14	Επικοινωνία με κέντρο υγείας για παροχή ασθενοφόρου	5 days	Wed 18/12/24	Tue 24/12/24	13	0,00 €	0,00 €	
15	Ιατρική περιβαλψη	6 days	Wed 25/12/24	Wed 1/1/25	14	10,00 €	0,00 €	
16	Οργάνωση χώρου και εξοπλισμού	23 days	Thu 2/1/25	Mon 3/2/25	10	810,00 €	0,00 €	
17	Κράτηση πανοραφιακών ηγνέδων	5 days	Thu 2/1/25	Wed 8/1/25	10	0,00 €	0,00 €	
18	Κράτηση δημοτικών ηγνέδων	8 days	Thu 9/1/25	Mon 20/1/25	17	0,00 €	0,00 €	
19	Καθαρισμός-συντήρηση-διμόρφωση	10 days	Tue 21/1/25	Mon 3/2/25	17,18	800,00 €	0,00 €	
20	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	4 days	Tue 21/1/25	Fri 24/1/25	17,18	3,00 €	0,00 €	
21	Προμήθεια αθλητικής ενδυμασίας	6 days	Mon 27/1/25	Mon 3/2/25	20	5,00 €	0,00 €	
22	Προμήθεια βραβείων	2 days	Mon 27/1/25	Tue 28/1/25	20	2,00 €	0,00 €	
23	Χορηγίες	35 days	Tue 4/2/25	Mon 24/3/25	16	500,00 €	0,00 €	
24	Επικοινωνία με χορηγούς	5 days	Tue 4/2/25	Mon 10/2/25	16	0,00 €	0,00 €	
25	Διαφήμιση μέσω τύπων στα μπλουζάκια	30 days	Tue 11/2/25	Mon 24/3/25	24	500,00 €	0,00 €	
26	Συμφωνία για τις χρηματικές απολαβές από τις χορηγίες	5 days	Tue 11/2/25	Mon 17/2/25	24	0,00 €	0,00 €	
27	Απολογισμός υλικών προμηθειών	3 days	Tue 18/2/25	Thu 20/2/25	24,26	0,00 €	0,00 €	
28	Καμπάνια προβολής/εγγραφών	29 days	Tue 25/3/25	Fri 5/4/25	23	50,50 €	0,00 €	
29	Αφίσες	15 days	Tue 25/3/25	Mon 14/4/25	27	0,50 €	0,00 €	
30	Social Media	2 days	Tue 25/3/25	Wed 26/3/25	24	50,00 €	0,00 €	
31	Μοίρασμα φυλλαδίων στις σχολές	14 days	Tue 15/4/25	Fri 2/5/25	29	0,00 €	0,00 €	
32	Google form για εγγραφές	5 days	Thu 27/3/25	Wed 24/4/25	30	0,00 €	0,00 €	
33	Στελέχωση ομάδων για δια ζώσης εγγραφές	1,67 days	Thu 3/4/25	Fri 4/4/25	32	0,00 €	0,00 €	
34	Εθελοντές για τις εγγραφές	10 days	Fri 4/4/25	Fri 18/4/25	33	0,00 €	0,00 €	
35	Οργάνωση αγωνιστικού προγράμματος	16 days	Mon 5/5/25	Mon 26/5/25	28	410,67 €	0,00 €	
36	Ορισμός χρηματικού ποσού για είσοδο και συμμετοχή	1 day	Mon 5/5/25	Mon 5/5/25	28	0,00 €	0,00 €	
37	Καθορισμός ώρας και ημερομηνίας	2 days	Mon 5/5/25	Tue 6/5/25	16	0,00 €	0,00 €	
38	Δημιουργία προγράμματος αγώνων	7 days	Wed 7/5/25	Thu 15/5/25	37	0,00 €	0,00 €	
39	Εύρεση διατητών και κανονισμών	7 days	Fri 16/5/25	Mon 26/5/25	38	280,00 €	0,00 €	
40	Εύρεση συντονιστικής ομάδας	4 days	Wed 7/5/25	Mon 12/5/25	37	0,00 €	0,00 €	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Cost	Fixed Cost	4 Nov '24
41	Εύρεση φωτογραφικής ομάδας	0,33 days	Wed 7/5/25	Wed 7/5/25	37	18,67 €	0,00 €	S M T W T F S
42	Κράτηση dj	2 days	Wed 7/5/25	Thu 8/5/25	37	112,00 €	0,00 €	
43	Απολογισμός έργου	75,5 days	Tue 11/2/25	Tue 27/5/25		28,00 €	0,00 €	
44	Απονομή Βραβείων	0,5 days	Tue 27/5/25	Tue 27/5/25	35	28,00 €	0,00 €	
45	Αποτίμηση Εσόδων	3 days	Tue 6/5/25	Thu 8/5/25	36	0,00 €	0,00 €	
46	Παράδοση Δωρεάς στο ίδρυμα	2 days	Fri 9/5/25	Mon 12/5/25	45	0,00 €	0,00 €	
47	Συλλογή Ανατροφοδότησης	7 days	Tue 11/2/25	Wed 19/2/25	24	0,00 €	0,00 €	
48	Αξιολόγηση Επιτυχίας	3 days	Fri 9/5/25	Tue 13/5/25	45	0,00 €	0,00 €	
49	Τελικό Meeting	3 days	Wed 14/5/25	Fri 16/5/25	47,48	0,00 €	0,00 €	
50	finish	0 days	Tue 27/5/25	Tue 27/5/25	43	0,00 €	0,00 €	


Εικόνα 5

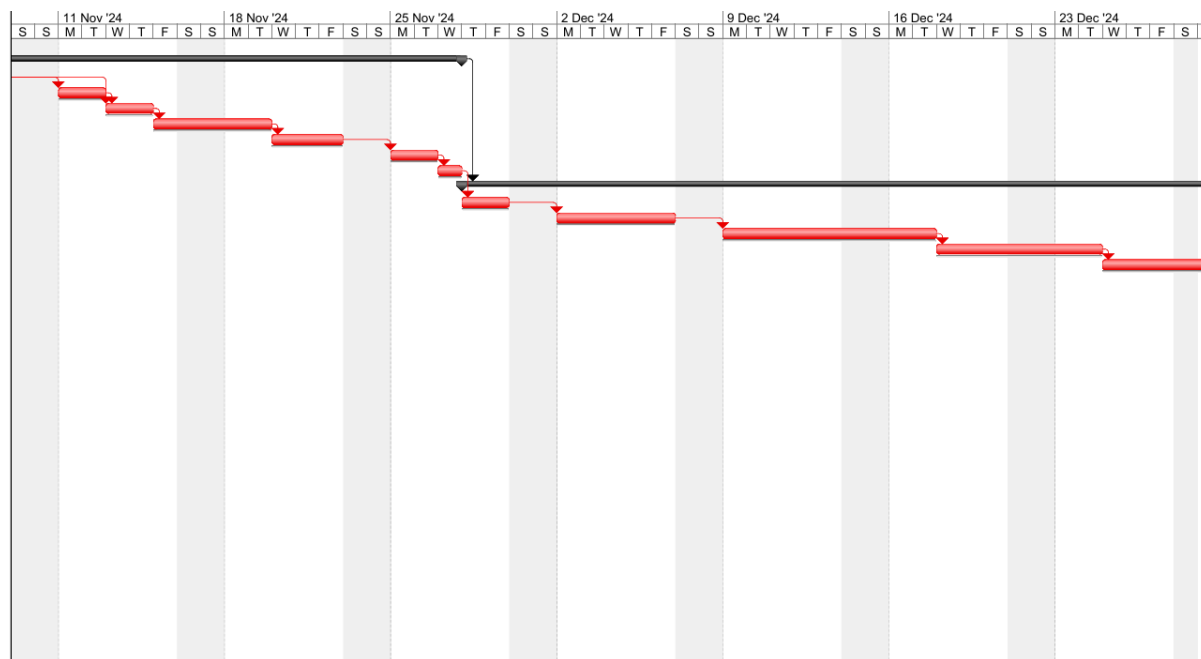


Εικόνα 6.

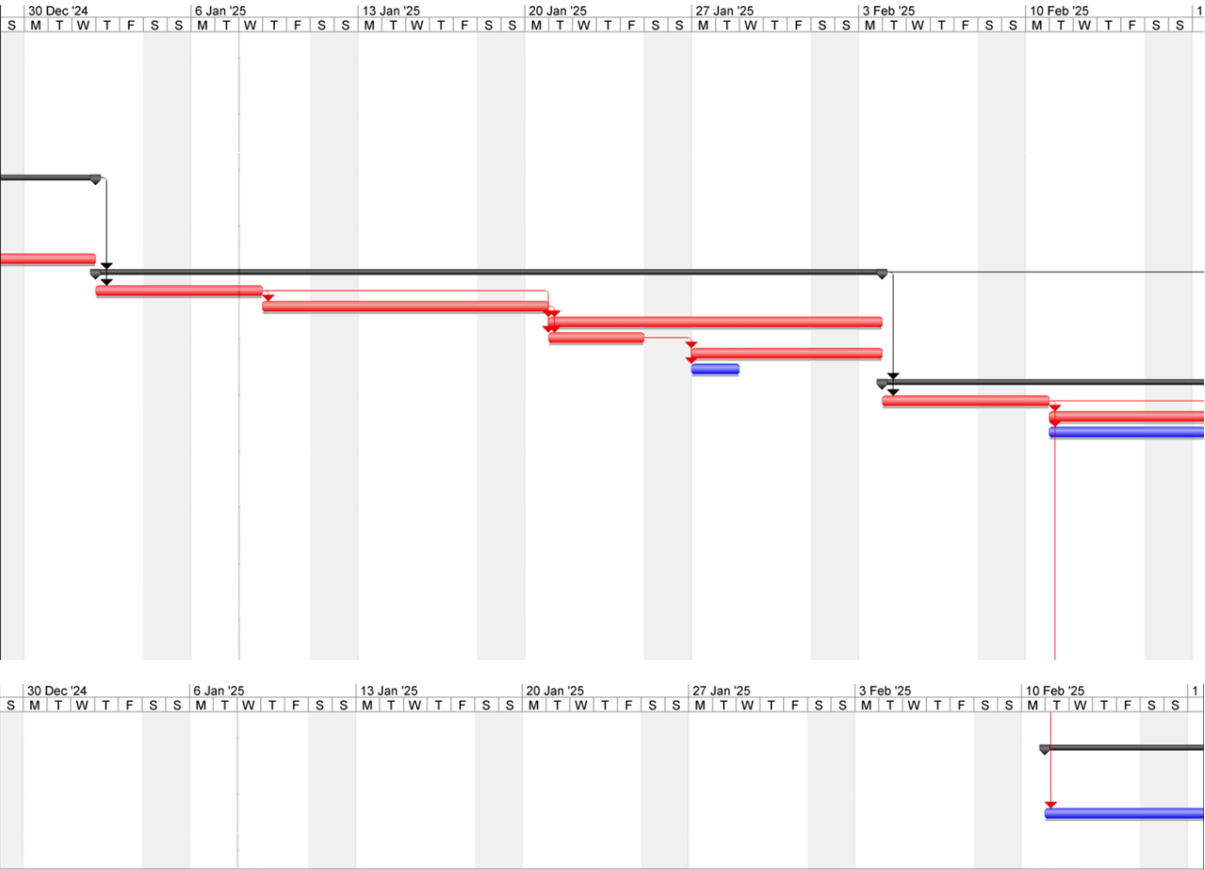

Εικόνα 7.

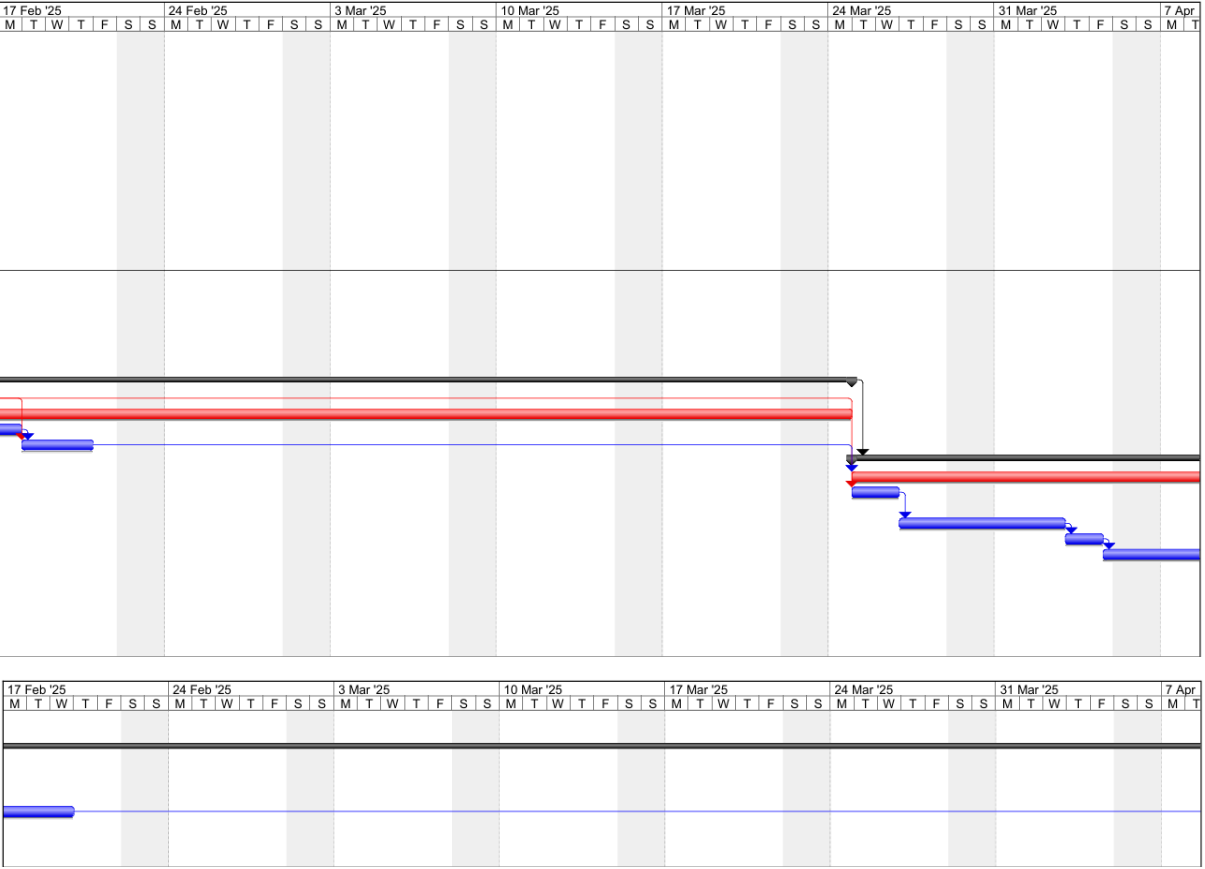

Εικόνα 8.

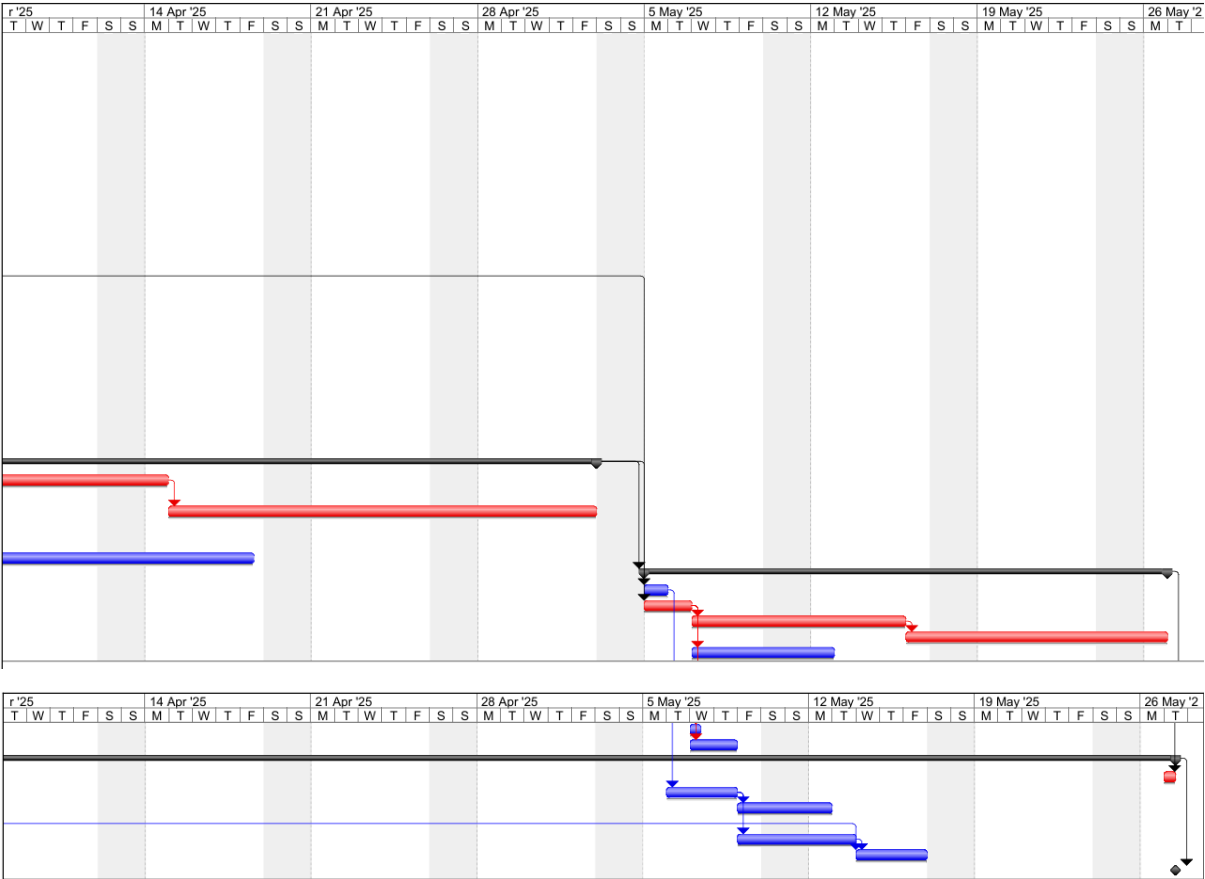

Εικόνα 9.

4.3 MILESTONES/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ DEADLINES

Πίνακας Παραδοτέων

ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
0.1	Στελέχωση ομάδας	8/11	Εύρεση ικανή ομάδας
0.2	Ορισμός PM	12/11	Καθορισμός project manager
0.3	Kick-off συνάντηση	14/11	Αρχική συνάντηση για τον ορισμό των βασικών κατευθύνσεων
0.4	Καθορισμός στόχων και απαιτήσεων	19/11	Καθορισμός στόχων και απαιτήσεων του έργου
0.5	Καθορισμός in scope και out of scope	22/11	Διαχωρισμός όσων περιλαμβάνονται και όσων δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του έργου
0.6	Καθορισμός προϋπολογισμού	26/11	Προσδιορισμός των αναμενόμενων εσόδων και εξόδων
0.7	Εκτίμηση ρίσκων	27/11	Καταμέτρηση πιθανών κινδύνων
1.1	Επικοινωνία με πρύτανη	4/11	Έγκριση προβολής του πανεπιστημίου
1.2	Επικοινωνία με δήμο	6/11	Απόκτηση άδειας για την πραγματοποίηση του τουρνουά
1.3	Επικοινωνία με ίδρυμα	8/11	Αποδοχή προσφοράς των εσόδων

1.4	Επικοινωνία με κέντρο υγείας για παροχή ασθενοφόρου	12/11	Εξασφάλιση παρουσίας ασθενοφόρων στους αγώνες
1.5	Ιατρική περίθαλψη	15/11	Εξασφάλιση εθελοντών γιατρών
2.1	Κράτηση πανεπιστημιακών γηπέδων	22/11	Εξασφάλιση γηπέδων από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια
2.2	Κράτηση δημοτικών γηπέδων	27/11	Εξασφάλιση δημοτικών γηπέδων
2.3	Καθαρισμός/ Συντήρηση/Διαμόρφωση χώρου	11/12	Εύρεση και κράτηση συνεργείου καθαρισμού
2.4	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	21/11	Αγορά απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. μπάλες, σφυρίχτρες) για την διεξαγωγή των αγώνων
2.5	Προμήθεια αθλητικής ενδυμασίας	25/11	Αγορά ενδυμασίας για τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές
2.6	Προμήθεια βραβείων	19/11	Αγορά μεταλλίων και κυπέλλων
3.1	Επικοινωνία με χορηγούς	18/12	Εύρεση πιθανών χορηγών
3.2	Διαφήμιση μέσω τύπωσης στα μπλουζάκια	29/1	Τύπωση των χορηγών και του λογότυπου της διοργάνωσης στα μπλουζάκια
3.3	Συμφωνία για τις χρηματικές απολαβές από τις χορηγίες	25/12	Υπολογισμός budget

			Για την διοργάνωση του τουρνουά
3.4	Απολογισμός υλικών προμηθειών	30/1	Υπολογισμός των συνολικών υλικών προμηθειών από τους χορηγούς
4.1	Αφίσες	19/2	Δημιουργία αφισών με τις απαραίτητες πληροφορίες για το τουρνουά καθώς και με τους χορηγούς
4.2	Social media	31/1	Πρωώθηση του τουρνουά μέσω επί πληρωμής διαφήμισης
4.3	Μοίρασμα φυλλαδίων στις σχολές	18/2	Ανάθεση σε εθελοντές το μοίρασμα των διαφημιστικών φυλλαδίων
4.4	Google forms για εγγραφές	12/2	Δημιουργία ενός google form για την εγγραφή των ομάδων
4.5	Στελέχωση ομάδων για δια ζώσης εγγραφές	5/2	Εύρεση εθελοντών για τις δια ζώσης εγγραφές
4.6	Εθελοντές για τις εγγραφές	19/2	Ορισμός των εθελοντών σε σταθερά σημεία των πανεπιστημίων για τις δια ζώσης εγγραφές
5.1	Ορισμός χρηματικού ποσού για είσοδο και συμμετοχή	20/2	Καθορισμός ενός προσιτού ποσού για την συμμετοχή και την παρακολούθηση των αγώνων

5.2	Καθορισμός ώρας και ημερομηνίας	21/2	Ανακοίνωση διάρκειας τουρνουά και ωρών διεξαγωγής του
5.3	Δημιουργία προγράμματος αγώνων	28/2	Ανακοίνωση της σειράς πραγματοποίησης κάθε αθλήματος
5.4	Εύρεση διαιτητών και κανονισμών	11/3	Εξασφάλιση διαιτητών και δημιουργία των κανονισμών
5.5	Εύρεση συντονιστικής ομάδας	26/2	Εύρεση απαραίτητου αριθμού εθελοντών για τον συντονισμό κάθε κατηγορίας αθλήματος
5.6	Εύρεση φωτογραφικής ομάδας	25/2	Κράτηση φωτογράφων για την διοργάνωση
5.7	Κράτηση DJ	21/2	Εξασφάλιση DJ για όλα τα γήπεδα καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων
6.1	Απονομή βραβείων	27/5	Τελετή λήξης με την απονομή βραβείων στους νικητές
6.2	Αποτίμηση εσόδων	8/5	Σύγκριση των τελικών εσόδων σε σχέση με τα προσδοκώμενα εσόδα
6.3	Παράδοση δωρεάς στο ίδρυμα	12/5	Επίσκεψη του ιδρύματος για την παράδοση της δωρεάς
6.4	Συλλογή ανατροφοδότησης	19/5	Μοίρασμα ερωτηματολογίων στο ίδρυμα, στους χορηγούς και στους συμμετέχοντες

6.5	Αξιολόγηση επιτυχίας	13/5	Αξιολόγηση αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων και των τελικών εσόδων
6.6	Τελικό meeting	16/5	Τελευταία συνάντηση της ομάδας και συζήτηση εμπειρίας

Πίνακας 1.

Πίνακας Οροσήμων

ID	ΤΙΤΛΟΣ
1	Start
3	Στελέχωση ομάδας
11	Επικοινωνία με πρότυπη
18	Κράτηση δημοτικών γηπέδων
26	Συμφωνία για χρηματικές απολαβές από χορηγούς
32	Google forms για εγγραφές
38	Δημιουργία προγράμματος αγώνων
50	Finish

Πίνακας 2.

4.4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ (RAM/RACI)

Ορολογία από διάγραμμα RAM:

WORK PACKAGES	Project Manager	Communication and Promotion Manager	Logistics Manager	Referees and Regulations Manager	Registrations Manager
Work package 0	A	I	R	R	C
Work Package 1	A	R	R	C	I
Work Package 2	I	A	C	R	R
Work Package 3	R	C	I	A	R
Work Package 4	R	I	A	I	C
Work Package 5	C	R	R	I	A
Work package 6	A	R	R	I	C

Πίνακας 3.

R(responsible):Το άτομο που εκτελεί το καθήκον. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί.

A(accountable):Το άτομο που έχει την τελική ευθύνη για το καθήκον. Υπάρχει μόνο ένας.

C(consulted):Τα άτομα που παρέχουν συμβουλές ή απόψεις.

I(informed):Τα άτομα που ενημερώνονται για την πρόοδο ή το αποτέλεσμα.

4.5 RESOURCE USAGE CHART

Task Name	
start	
Σχεδίαση έργου	
Στλέχωση ομάδας	
Ορισμός PM	
Kick-off συνάντηση	
Καθορισμός στόχων και απαιτήσεων	
Καθορισμός in score και out of score	
Καθορισμός προϋπολογισμού	
Εκτίμηση ρίσκων	
Άδειες	
Επικοινωνία με πρύτανι	Διοργανωτές
Επικοινωνία με δήμο	Άδειες[100,00 €]
Επικοινωνία με ίδρυμα	Διοργανωτές
Επικοινωνία με κέντρο υγείας για παροχή ασθενοφόρου	Ιατρικό προσωπικό
Ιατρική περίθαλψη	Κουτί πρώτων βοηθειών [1 Τεμάχιο]
Οργάνωση χώρου και εξοπλισμού	
Κράτηση πανεπιστημιακών γηπέδων	Αθλητικές εγκαταστάσεις [1 Γήπεδο]
Κράτηση δημοτικών γηπέδων	Αθλητικές εγκαταστάσεις [1 Γήπεδο]
Καθαρισμός-συντήρηση-διμόρφωση	Συνεργείο καθαρισμού
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	Μπάλες [1 Τεμάχιο]
Προμήθεια αθλητικής ενδυμασίας	Φανέλες[1 Τεμάχιο];Μπλουζάκια διοργανωτών [1 Τεμάχιο]
Προμήθεια βραβείων	Βραβεία[1 Τεμάχιο]
Χορηγίες	
Επικοινωνία με χορηγούς	Διοργανωτές
Διαφήμιση μέσω τύπωσης στα μπλουζάκια	Τύπωση logo σε μπλουζάκια-φανέλες[500,00 €]
Συμφωνία για τις χρηματικές απολαβές από τις χορηγίες	Διοργανωτές
Απολογισμός υλικών προμηθειών	Διοργανωτές
Καμπάνια προβολής/εγγραφών	
Αφίσες	Αφίσες [1 Τεμάχιο]
Social Media	Πρωώθηση μέσω social media[50,00 €]
Μοίρασμα φυλλαδίων στις σχολές	Εθελοντές
Google form για εγγραφές	Διοργανωτές
Στελέχωση ομάδων για δια ζώσης εγγραφές	Διοργανωτές
Εθελοντές για τις εγγραφές	Εθελοντές
Οργάνωση αγωνιστικού προγράμματος	
Ορισμός χρηματικού ποσού για είσοδο και συμμετοχή	Διοργανωτές
Καθορισμός ώρας και ημερομηνίας	Διοργανωτές
Δημιουργία προγράμματος αγώνων	Διοργανωτές
Εύρεση διαιτητών και κανονισμών	Διαιτητές
Εύρεση συντονιστικής ομάδας	Εθελοντές
Εύρεση φωτογραφικής ομάδας	Φωτογράφος
Κράτηση dj	dj
Απολογισμός έργου	
Απονομή Βραβείων	
Αποτίμηση Εσόδων	
Παράδοση Δωρεάς στο ίδρυμα	
Συλλογή Ανατροφοδότησης	
Αξιολόγηση Επιτυχίας	
Τελικό Meeting	
finish	

Πίνακας 4.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Μικρή ανάλυση του κάθε κινδύνου:

- 1) Καθυστερήση στην επικοινωνία με τρίτους μπορεί να οδηγήσει σε αναβολές ή προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα του έργου.
- 2) Αδυναμία εξεύρεσης χορηγών μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα και ανάγκη μείωσης του προϋπολογισμού.
- 3) Προβλήματα με τις κρατήσεις εγκαταστάσεων μπορούν να προκαλέσουν ακυρώσεις ή ανάγκη αλλαγής χώρου.
- 4) Έλλειψη ενδιαφέροντος από εθελοντές μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα υλοποίησης δραστηριοτήτων.
- 5) Αποτυχία προώθησης της καμπάνιας στα social media μπορεί να μειώσει την απήχηση και τη συμμετοχή στην εκδήλωση.
- 6) Τεχνικές δυσκολίες στη χρήση εργαλείων όπως τα Google Forms μπορεί να καθυστερήσουν τη συλλογή δεδομένων.
- 7) Ανακριβής προϋπολογισμός εξόδων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανασφάλεια ή ανάγκη ανακατανομής πόρων.
- 8) Έλλειψη συντονισμού μεταξύ τμημάτων μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις ή κακή εκτέλεση εργασιών.
- 9) Απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα μπορεί να επηρεάσουν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.
- 10) Μη τήρηση προθεσμιών για milestones μπορεί να καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου.
- 11) Αποτυχία εξασφάλισης κατάλληλου εξοπλισμού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διεξαγωγή της εκδήλωσης.
- 12) Ελλιπής ενημέρωση συμμετεχόντων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ή μειωμένη συμμετοχή.

13) Προβλήματα υγείας ή ασφάλειας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες.

14) Αδυναμία συμμόρφωσης με κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει νομικά ή διοικητικά προβλήματα.

5.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

α/α	Κίνδυνος	Πιθανότητα (1-10)	Αντίκτυπος (1-10)	Σύνολο	Πλάνο για να αποτραπεί ο κίνδυνος	Πλάνο εάν ο κίνδυνος πραγματοποιηθεί	Υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του κινδύνου
1	Καθυστέρηση στην επικοινωνία με τρίτους	5	7	35	Συνεχής παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων	Επικοινωνία με εναλλακτικούς προμηθευτές	Πολύζου Μαριάνθη
2	Αδυναμία εξεύρεσης χορηγών	6	8	48	Πρόωρη αναζήτηση χορηγών	Μείωση κόστους εκδήλωσης	Μαυριά Ελένη-Μαρία
3	Προβλήματα με τις κρατήσεις εγκαταστάσεων	4	6	24	Πρόωρη επιβεβαίωση κρατήσεων	Χρήση εναλλακτικών χώρων	Χατζηανδρέου Νικολέτα
4	Έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχή εθελοντών	5	7	35	Καμπάνια ευαισθητοποίησης	Μείωση του εύρους εκδήλωσης	Μπάρκα Παναγιώτα
5	Αποτυχία προώθησης της καμπάνιας στα social media	6	8	48	Επαγγελματική διαχείριση καμπάνιας	Αναπροσαρμογή στρατηγικής	Μπάρκα Παναγιώτα
6	Τεχνικές δυσκολίες	3	5	15	Εκπαίδευση στη	Χειροκίνητη διαχείριση	Μπάρκα Παναγιώτα

	στη χρήση εργαλείων όπως Google Forms				χρήση εργαλείων		
7	Ανακριβής προϋπολογισμός εξόδων	4	7	28	Αναλυτικός αρχικός προϋπολογισμός	Εσωτερική ανακατανομή κεφαλαίων	Μπάρκα Παναγιώτα
8	Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των τμημάτων	5	6	30	Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων	Δημιουργία ομάδας κρίσης	Σοφία Τουμπέλη
9	Απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα	3	9	27	Πρόβλεψη εναλλακτικών κλειστών χώρων	Αναβολή εκδήλωσης	Σοφία Τουμπέλη
10	Μη τήρηση προθεσμιών για milestones	5	8	40	Συνεχής υπενθύμιση προθεσμιών	Προσαρμογή του προγράμματος	Πολύζου Μαριάνθη
11	Αποτυχία εξασφάλισης κατάλληλου εξοπλισμού	4	7	28	Έγκαιρη διασφάλιση εξοπλισμού	Ενοικίαση εξοπλισμού	Χατζηανδρέου Νικολέτα
12	Ελλιπής ενημέρωση των συμμετεχόντων	5	6	30	Δημιουργία αναλυτικού ενημερωτικού υλικού	Συνεχής ενημέρωση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης	Μπάρκα Παναγιώτα
13	Προβλήματα υγείας ή ασφάλειας	3	9	27	Παρουσία ιατρικού	Άμεση παροχή	Σοφία Τουμπέλη

	κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων				προσωπικού	πρώτων βοηθειών	
14	Αδυναμία συμμόρφωσης με κανονισμούς και νομικές απαιτήσεις	4	8	32	Έλεγχος κανονισμών από νομικό σύμβουλο	Αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων	Σοφία Τουμπέλη

Πίνακας 5.

6.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual
19	Καθαρισμός-συντήρηση-δημόρφωση	0,00 €	Prorated	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
39	Εύρεση διατητών και καινοτομιών	0,00 €	Prorated	560,00 €	0,00 €	560,00 €	0,00 €
25	Διαφήμιση μέσω τύπωσης στα μπλου	0,00 €	Prorated	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
41	Εύρεση φωτογραφικής ομάδας	0,00 €	Prorated	224,00 €	0,00 €	224,00 €	0,00 €
42	Κράτηση dj	0,00 €	Prorated	112,00 €	0,00 €	112,00 €	0,00 €
12	Επικοινωνία με δήμο	0,00 €	Prorated	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
30	Social Media	0,00 €	Prorated	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
15	Γατρική περιθαλψη	0,00 €	Prorated	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €
21	Προμήθεια αθλητικής ενδυμασίας	0,00 €	Prorated	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €
20	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	0,00 €	Prorated	3,00 €	0,00 €	3,00 €	0,00 €
22	Προμήθεια βραβείων	0,00 €	Prorated	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €
29	Αφίσες	0,00 €	Prorated	0,50 €	0,00 €	0,50 €	0,00 €
1	start	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Στέλεψη ομάδας	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Ορισμός PM	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Kick-off συνάντηση	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Καθαρισμός στόχων και απαιτήσεων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Καθαρισμός in score και out of score	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Καθαρισμός προϋπολογισμού	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Εκτίμηση ρίσκων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Επικοινωνία με πρύτανη	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Επικοινωνία με ίδρυμα	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Επικοινωνία με κέντρο υγείας για παρ	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Κράτηση πανεπιστημιακών γηπέδων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Κράτηση δημοτικών γηπέδων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Επικοινωνία με χορηγούς	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Συμφωνία για τις χρηματικές απολαβέ	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Απολογισμός υλικών προμηθειών	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Μοίρασμα φυλλαδίων στις σχολές	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Google form για εγγραφές	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Στέλεψη ομάδων για δια ζώσης εγγ	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Εθελοντές για τις εγγραφές	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	Ορισμός χρηματικού ποσού για είσοδ	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Καθαρισμός ώρας και ημερομηνίας	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Δημιουργία προγράμματος αγώνων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40	Εύρεση συντονιστικής ομάδας	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44	Απονομή βραβείων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Αποτίμηση Εσόδων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	Παράδοση Δωρεάς στο ίδρυμα	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47	Συλλογή Ανατροφοδότησης	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	Αξιολόγηση Επιτυχίας	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Τελικό Meeting	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	finish	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €		2.366,50 €	0,00 €	2.366,50 €	0,00 €

Εικόνα 10.

6.1 Σταθερά Κόστη

Στο συγκεκριμένο project, τα σταθερά κόστη (Fixed Cost) για όλες τις εργασίες εμφανίζονται ως 0,00 €. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν προαποφασισμένα ή ανεξάρτητα από την πρόοδο κόστη που σχετίζονται με το έργο. Όλα τα κόστη είναι ευέλικτα και συνδέονται με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση του project. Η απουσία σταθερών εξόδων μπορεί να υποδεικνύει ότι η φύση του έργου βασίζεται εξ ολοκλήρου σε μεταβλητά κόστη, τα οποία εξαρτώνται από την ολοκλήρωση ή την πρόοδο των επιμέρους εργασιών.

6.2 Μεταβλητά Κόστη

Στο project αυτό, τα μεταβλητά κόστη αποτελούν το σύνολο των εξόδων που συνδέονται με συγκεκριμένες εργασίες. Κάποιες από τις εργασίες που εμφανίζουν κόστη είναι:

Η εργασία "Καθαρισμός-συντήρηση-δημιουργηση" με συνολικό κόστος 800,00 €.

Η εργασία "Εύρεση διατητών και καινοτομιών" με κόστος 560,00 €.

Η εργασία "Διαφήμιση μέσω τυπώσεων στις αίθουσες" με κόστος 500,00 €.

Άλλες εργασίες, όπως η "Εύρεση φωτογραφικής ομάδας" (224,00 €) και "Κράτηση dj" (112,00 €), παρουσιάζουν μικρότερα αλλά σημαντικά κόστη.


6.3 Συνολικά κόστη

Το συνολικό μεταβλητό κόστος ανέρχεται στα 2.366,50 €, το οποίο κατανομήθηκε στις εργασίες με τη μέθοδο "Prorated", δηλαδή αναλογικά με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας. Αυτό δείχνει ότι το έργο προσαρμόζει τα έξοδα ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση των πόρων.


6.4 Αντιμετώπιση ανεπάρκειας πόρων

	Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
1	Αδοξας	Cost		A	Αδοξας					Prorated		
2	Κουτί πρώτων βοηθών	Material	Τεμάχιο	K	Υλικοτεχνικ		10,00 €		0,00 €	Prorated		
3	Αθλητικές εγκαταστάσεις	Material	Γήπεδο	A	Υλικοτεχνικ		0,00 €		0,00 €	Prorated		
4	Ιατρικό προσωπικό	Work		I	Ανθρώπινο	1.000%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
5	Συνεργείο καθαρισμού	Work		Σ	Ανθρώπινο	1.000%	10,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
6	Μπιτόλις	Material	Τεμάχιο	M	Υλικοτεχνικ		3,00 €		0,00 €	Prorated		
7	Φανέλες	Material	Τεμάχιο	Φ	Υλικοτεχνικ		3,00 €		0,00 €	Prorated		
8	Σφουγίτριες	Material	Τεμάχιο	Σ	Υλικοτεχνικ		0,50 €		0,00 €	Prorated		
9	Διοργανωτές	Work		Δ	Ανθρώπινο	500%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
10	Διοικητές	Work		Δ	Ανθρώπινο	50%	5,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
11	Εθελοντές	Work		E	Ανθρώπινο	5.000%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
12	Βραβεία	Material	Τεμάχιο	B	Υλικοτεχνικ		2,00 €		0,00 €	Prorated		
13	Προώθηση μέσω social	Cost		Π	Προώθηση					Prorated		
14	Φωτογράφοι	Work		Φ	Ανθρώπινο	50%	7,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
15	DJ	Work		d	Ανθρώπινο	50%	7,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
16	Αφίσες	Material	Τεμάχιο	A	Υλικοτεχνικ		0,50 €		0,00 €	Prorated		
17	Φυλλάδια	Material	Τεμάχιο	Φ	Υλικοτεχνικ		0,10 €		0,00 €	Prorated		
18	Μπλουζάκια διοργάνωσης	Material	Τεμάχιο	M	Υλικοτεχνικ		2,00 €		0,00 €	Prorated		
19	Τύπωση logo σε μπλ	Cost		T						Prorated		


Εικόνα 11.

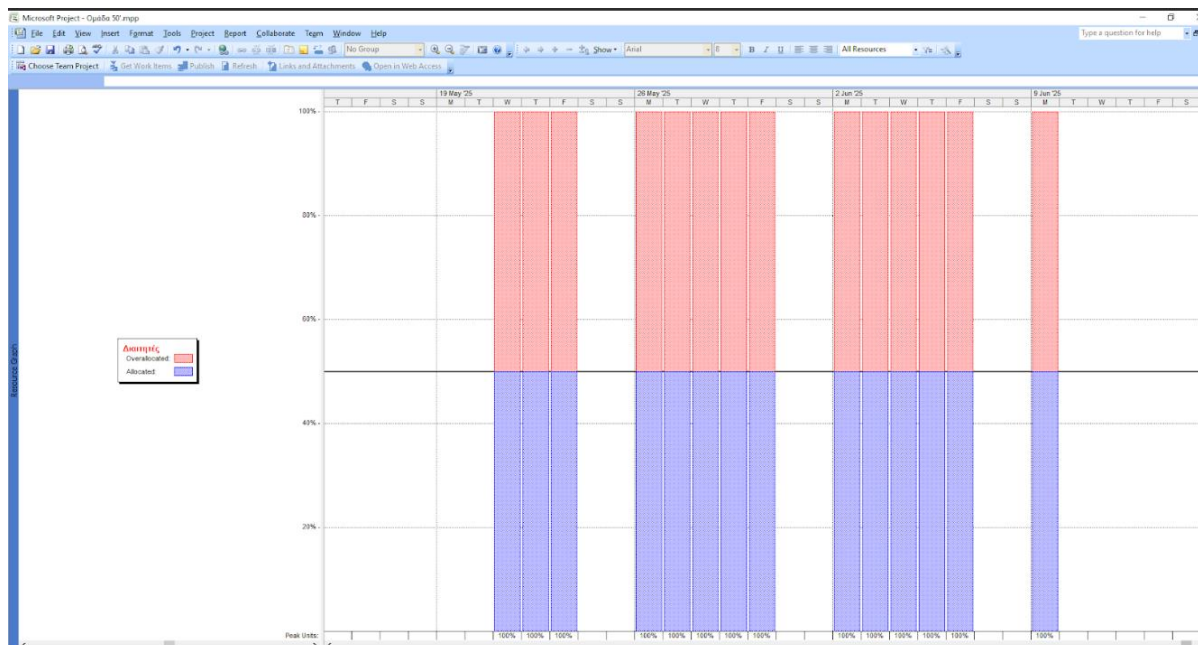

Εικόνα12.

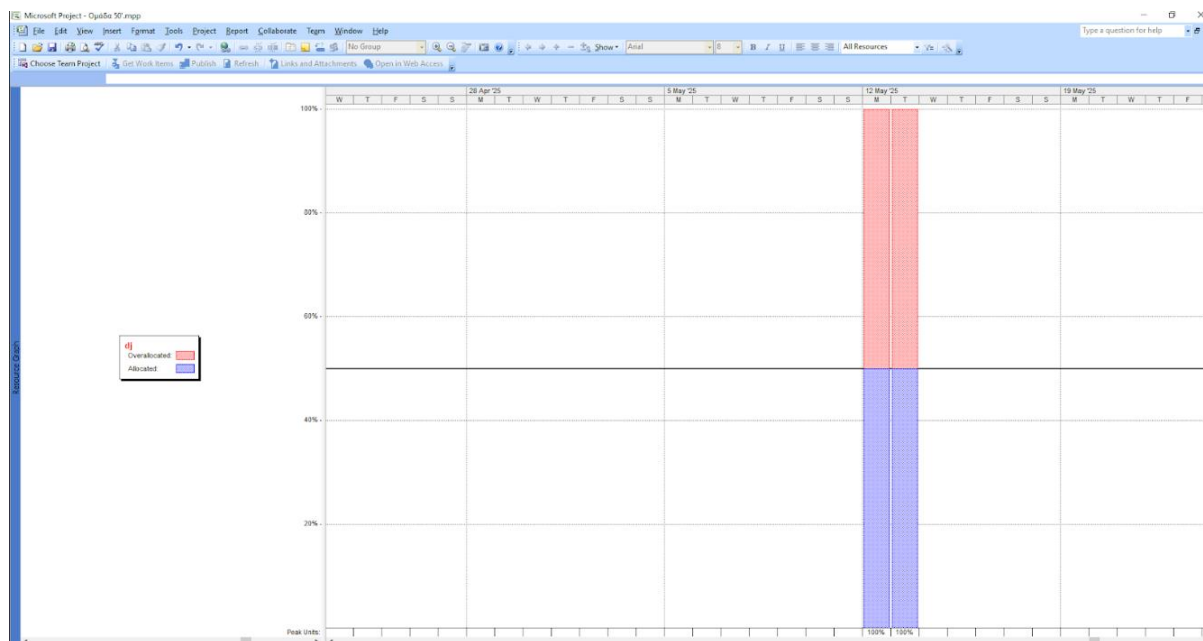

Εικόνα 13.

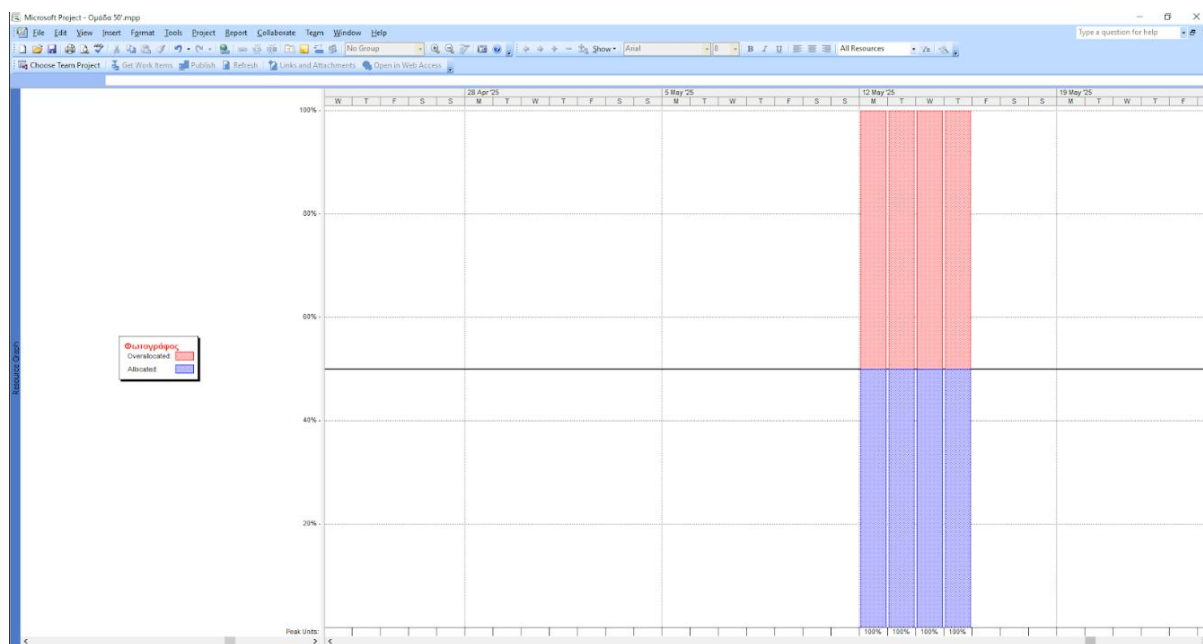

Εικόνα 14.

	Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Peak	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
1	Αδός	Cost		A	Αδός	0%					Prorated		
2	Κουπί πρώτων βοηθών	Material	Τιμάρο	K	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		10,00 €		0,00 €	Prorated		
3	Αθλητικές γυμναστικές	Material	Γήπεδο	A	Υλικοτεχνικές	Γήπεδο/day		0,00 €		0,00 €	Prorated		
4	Ιατρικό προσωπικό	Work		I	Ανθρώπινα	100%	1.000%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
5	Συντονιστής καθαρισμού	Work		S	Ανθρώπινα	100%	1.000%	10,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
6	Μπλόκ	Material	Τιμάρο	M	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		3,00 €		0,00 €	Prorated		
7	Φανίλας	Material	Τιμάρο	Φ	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		3,00 €		0,00 €	Prorated		
8	Σφαίρες	Material	Τιμάρο	S	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		0,50 €		0,00 €	Prorated		
9	Διοργανωτής	Work		D	Ανθρώπινα	300%	300%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
10	Διαπρέζ	Work		D	Ανθρώπινα	100%	1.000%	5,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
11	Εθελοντές	Work		E	Ανθρώπινα	3.200%	3.200%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
12	Βραβεία	Material	Τιμάρο	B	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		2,00 €		0,00 €	Prorated		
13	Πρωτόκολλο μέσων	Cost		P	Πρωτόκολλο	0%					Prorated		
14	Φωτογράφος	Work		Φ	Ανθρώπινα	100%	300%	7,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
15	DJ	Work		D	Ανθρώπινα	100%	100%	7,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	Standard	
16	Αφίσες	Material	Τιμάρο	A	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		0,50 €		0,00 €	Prorated		
17	Φυλλάδια	Material	Τιμάρο	Φ	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		0,10 €		0,00 €	Prorated		
18	Μητρώο διοργάνωσης	Material	Τιμάρο	M	Υλικοτεχνικές	Τιμάρο/day		2,00 €		0,00 €	Prorated		
19	Υπόμνηση λογ. σε μπτα	Cost		T		0%					Prorated		

Εικόνα 15.

Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε leveling των πόρων, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και κατανομή των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων. Η διαδικασία του leveling επιτρέπει τη διαχείριση των συγκρούσεων και των υπερβολικών απαιτήσεων πόρων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του project. Στον πίνακα των πόρων, παρατηρείται ότι για συγκεκριμένους πόρους, όπως οι **Φωτογράφοι** και οι **Διαπρέζ**, έχουν καθοριστεί μέγιστα ποσοστά χρήσης (π.χ. 50%), ώστε να μην υπερβαίνουν τις δυνατότητες διαθεσιμότητάς τους.

Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά όπως το "Std. Rate" και το "Cost/Use" αποτυπώνουν το κόστος χρήσης των πόρων, ενώ η κατανομή γίνεται με τη μέθοδο "Prorated" που εξασφαλίζει δίκαιη και αναλογική χρήση των πόρων με βάση τις απαιτήσεις του έργου. Το leveling βοήθησε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των πόρων και να διασφαλιστεί ότι κάθε εργασία ολοκληρώνεται χωρίς να υπερβαίνονται οι περιορισμοί. Έτσι, η διαχείριση του χρόνου και του κόστους του έργου διατηρήθηκε σε αποδεκτά επίπεδα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης.

7. Επιτελική Σύνοψη

Συμπεράσματα

Το αθλητικό τουρνουά UniGames αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ενίσχυσης της φοιτητικής κοινότητας και της κοινωνικής ευθύνης μέσω του αθλητισμού. Το έργο κατάφερε να οργανώσει με επιτυχία ένα πολυαθλητικό γεγονός, προάγοντας αξίες όπως η συνεργασία, η ευγενής άμιλλα και η φιλανθρωπία, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν στον σύλλογο «Αχτίδα» για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Η σωστή κατανομή ρόλων, η σαφής επικοινωνιακή στρατηγική και η χρήση τεχνολογικών εργαλείων, όπως το Zoom και το Google Drive, συνέβαλαν στην αποτελεσματική υλοποίηση της διοργάνωσης. Ωστόσο, προκλήσεις όπως η εξασφάλιση χορηγιών και ο συντονισμός των εθελοντών ανέδειξαν την ανάγκη για έγκαιρο προγραμματισμό και περισσότερες εφεδρικές λύσεις.

Για μελλοντικές διοργανώσεις προτείνεται:

- Η επέκταση της καμπάνιας προβολής μέσω social media.
- Η αναζήτηση περισσότερων στρατηγικών συνεργασιών με τοπικούς φορείς.
- Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εθελοντές πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Συνολικά, το UniGames απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μέσο κοινωνικής αλλαγής και ελπίζουμε η συγκεκριμένη διοργάνωση να εξελιχθεί σε θεσμό με ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στο μέλλον.

Προβλήματα

την υλοποίηση του έργου

Παρά τις αρχικές δυσκολίες στη διαχείριση χρόνου και τον συντονισμό, η ομαδική δουλειά βελτιώθηκε σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. . Οι προκλήσεις που προέκυψαν, όπως οι αρχικές καθυστερήσεις και οι διαφωνίες, αντιμετωπίστηκαν μέσω επαναπροσδιορισμού στόχων και αποτελεσματικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η συνολική εμπειρία κατέδειξε την αξία της ομαδικής εργασίας, της στρατηγικής σκέψης και της χρήσης προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σύνθετου έργου.

8.Πηγές

1. Scwalbe, K. (Επιμέλεια: Μ. Μαντάς, Λ. Τσιρώνης), Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων, 1η Έκδοση, Broken Hill Publishers, 2024
2. Διαλέξεις μαθήματος: Μαντάς Μ.(2024), Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,Εφαρμοσμένη Πληροφορική
3. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2024). Κατευθυντήριες Οδηγίες για Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΠΜ

9. Παράρτημα

9.1 Ατομικά timesheets

Μαριάνθη Πολύζου, Project Manager, Work Package 2

Task	Ημερομηνία	Ώρες ενασχόλησης	Περιγραφή
Επικοινωνία με πρύτανη	28-29/11	1 ώρα (28/11) 3 ώρες (29/11)	Κανονισμός και διεκπεραίωση ραντεβού
Επικοινωνία με δήμο	2-6/12	2 ώρες (2/12) 3 ώρες (5/12)	Εξασφάλιση άδειας για την πραγματοποίηση του event και την αξιοποίηση των δημοτικών γηπέδων
Επικοινωνία με ίδρυμα	9-17/12	2 ώρες (10/12) 2 ώρες (13/12) 1 ώρα (16/12)	Ενημέρωση του ιδρύματος και κλείσιμο συμφωνίας
Επικοινωνία με κέντρο υγείας για παροχή ασθενοφόρου	18-24/12	1 ώρα (18/12) 2 ώρες (20/12) 2 ώρες (23/12)	Επικοινωνία με κέντρα υγείας και Ε.Κ.Α.Β.
Ιατρική περίθαλψη	25/12-1/1	3 ώρες (28/12)	Προμήθεια κουτιών πρώτων βοηθειών

Νικολέτα Χατζηανδρέου, Communication and Promotion Manager, Work Package 3

Task	Ημερομηνία	Ώρες ενασχόλησης	Περιγραφή
Κράτηση πανεπιστημιακών γηπέδων	2-8/1	2 ώρες (3/1) 2 ώρες (4/1) 2 ώρες (8/1)	Επικοινωνία με τα πανεπιστήμια για την εξασφάλιση των γηπέδων
Κράτηση δημοτικών γηπέδων	9-20/1	3 ώρες (10/1) 2 ώρες (13/1) 2 ώρες (14/1) 1 ώρα (17/1)	Επικοινωνία για την κράτηση και επίσκεψη των διαθέσιμων δημοτικών γηπέδων

Καθαρισμός/Συντήρηση/ Διαμόρφωση των γηπέδων	21/1-3/2	2 ώρες (21/1) 2 ώρες (24/1) 2 ώρες (27/1)	Επικοινωνία με συνεργεία καθαρισμού και κλείσιμο των απαραίτητων ημερομηνιών
Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	21-24/1	3 ώρες (22/1) 3 ώρες (23/1)	Εφοδιασμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό για κάθε άθλημα
Προμήθεια αθλητικής ενδυμασίας	27/1-3/2	2 ώρες (29/1) 1 ώρα (3/2)	Επικοινωνία με προμηθευτές
Προμήθεια βραβείων	27-28/1	2 ώρες (28/1)	Εφοδιασμός με μετάλλια και κύπελα

Ελένη-Μαρία Μαυριά, Referees and Regulations Manager, Work Package 4

Task	Ημερομηνία	Ώρες ενασχόλησης	Περιγραφή
Επικοινωνία με χορηγούς	4-10/2	2 ώρες (4/2) 3 ώρες (6/2) 2 ώρες (7/2)	Εύρεση χορηγών
Διαφήμιση μέσω τύπωσης στα μπλουζάκια	11/2-24/3	3 ώρες (13/2) 4 ώρες (14/2) 3 ώρες (21/3)	Επικοινωνία και συμφωνία με τυπογραφεία και παραλαβή αποθέματος
Συμφωνία για τις χρηματικές απολαβές από τις χορηγίες	11-17/2	3 ώρες (11/2) 3 ώρες (16/2)	Τελική επικοινωνία με χορηγούς
Απολογισμός υλικών προμηθειών	18-20/2	2 ώρες (18/2) 2 ώρες (20/2)	Καταμέτρηση εξοπλισμού

Παναγιώτα Μπάρκα, Logistics Manager, Work Package 5

Task	Ημερομηνία	Ώρες ενασχόλησης	Περιγραφή
Αφίσες	25/3-14/4	3 ώρες (27/3) 2 ώρες (31/3) 3 ώρες (14/4)	Εύρεση τυπογραφείου και συμφωνία και

			παραλαβή αποθέματος
Social Media	25-26/3	4 ώρες (26/3)	Δημιουργία λογαριασμού και ανάρτηση του event
Μοίρασμα φυλλαδίων στις σχολές	15/4-2/5	1 ώρα (28/4) 1 ώρα (29/4) 1 ώρα (30/4) 1 ώρα (2/5)	Μοίρασμα φυλλαδίων
Google Forms για εγγραφές	27/3-2/4	2 ώρες (28/3)	Δημιουργία και ανάρτηση του Google form
Στελέχωση ομάδας για διά ζώσης εγγραφές	3-4/4	5 ώρες (3/4)	Εύρεση φοιτητών για διά ζώσης εγγραφές
Εθελοντές για τις εγγραφές	4-18/4	4 ώρες (4/4)	Ορισμός τοποθεσίας και ημερομηνίας για τις διά ζώσης εγγραφές

Σοφία Τουμπέλη, Registrations Manager, Work Package 6

Task	Ημερομηνία	Ώρες ενασχόλησης	Περιγραφή
Ορισμός χρηματικού ποσού για είσοδο και συμμετοχή	5/5	3 ώρες (5/5)	Ορισμός τιμής εισόδου και συμμετοχής για την εξασφάλιση των απαραίτητων εσόδων
Καθορισμός ώρας και ημερομηνίας	5-6/5	3 ώρες (6/5)	Ορισμός της ημερομηνίας έναρξης και λήξης του τουρνουά και ώρες δραστηριοποίησης κάθε μέρας

Δημιουργία προγράμματος αγώνων	7-16/5	2 ώρες (7/5) 3 ώρες (8/5) 3 ώρες (14/5) 2 ώρες (15/5)	Επικοινωνία με τα κλεισμένα γήπεδα και οριστικοποίηση του προγράμματος
Εύρεση διαιτητών και κανονισμών	16-26/5	2 ώρες (19/5) 2 ώρες (20/5) 2 ώρες (22/5) 3 ώρες (23/5)	Επικοινωνία με διαιτητές και κράτηση των διαθέσιμων καθώς και ορισμός των κανονισμών
Εύρεση συντονιστικής ομάδας	7-12/5	4 ώρες (9/5) 5 ώρες (12/5)	Εύρεση εθελοντών για τον συντονισμό των αγώνων και οριστικοποίηση της ημερομηνίας που θα δουλεύει ο καθένας
Εύρεση φωτογραφικής ομάδας	7/5	5 ώρες (7/5)	Κλείσιμο συμφωνίας με διαθέσιμη φωτογραφική ομάδα
Κράτηση DJ	7-8/5	3 ώρες (8/5)	Κλείσιμο συμφωνίας με διαθέσιμο DJ

9.2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Πρακτικά 2ης συνάντησης

Ημερομηνία 16/11

Τόπος : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συμμετέχοντες :Όλοι

Θέματα που συζητήθηκαν

- 1.Ιδέες πιθανών ημερομηνιών των αγώνων καθώς και εύρεση πιθανών δημοτικών γηπέδων για χρήση την διάρκεια του τουρνουά.30'(όλοι)
- 2.Οριμός υπεύθυνου για επικοινωνία με τους αρμόδιους εγκαταστάσεων για την κράτηση των γηπέδων.5'(Νικολέτα Χατζηανδρέου)
- 3.Εύρεση εταιριών για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τους αγώνες 40'.(όλοι)
- 4.Οριμός αρμόδιου για την επικοινωνία και προμήθεια του αθλητικού εξοπλισμού 5'.(Νικολέτα Χατζηανδρέου)
- 5.Οριμός νέα συνάντησης 10'(όλοι)

Πρακτικά 4ης συνάντησης

Ημερομηνία :18/2

Τόπος : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συμμετέχοντες :Όλοι

Θέματα που συζητήθηκαν

- 1.Δημιουργία αφισών και ψηφιακού περιεχομένου για τα social media με σκοπό την προώθηση του event 70'.(όλοι)
- 2.Δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορισμός διαχειριστή 15' .(Παναγιώτα Μπάρκα)
- 3.Πρώτη ανάρτηση προωθητικού υλικού στα social media και ορισμός ημερομηνίας της επόμενης ανάρτησης 15'.(Παναγιώτα Μπάρκα)
- 4.Οριστικοποίηση χορηγιών από την προηγούμενη συνάντηση 30'.(Ελένη-Μαρία Μαυριά)
- 5.Οριμός νέας συνάντησης 10'.(όλοι)
